



INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y  
**CAMBIO CLIMÁTICO - IDIGER**

## **Informe de Seguimiento a la Gestión**

### **PROYECTO DE INVERSIÓN: 1158- REDUCCIÓN DEL RIESGO Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO.**

Periodo de Seguimiento: 1 de Enero de 2020 a 31 de Mayo de 2020.

Subdirección para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático

Bogotá D.C, Junio 2020



**NOMBRE PROYECTO DE INVERSIÓN:** Reducción del riesgo y adaptación al cambio climático.

**INFORMACIÓN DE LA META PLAN DE DESARROLLO Y/O METAS PROYECTO DE INVERSIÓN**

METAS PLAN DE DESARROLLO Y/O PROYECTO	MAGNITUD FÍSICA			
	PROGRAMADO A 2020	PROGRAMADO RESERVA	EJECUCIÓN A 31 DE MAYO DE 2020	EJECUCIÓN RESERVA A 31 DE MAYO DE 2020
Incentivar y promover el cumplimiento de la norma de sismo resistencia y el reforzamiento estructural	Finalizada por Cumplimiento			
Formular una política de reasentamiento	Finalizada por Cumplimiento			
Reasentar a 313 familias localizadas en zonas de riesgo no mitigable	18	0	22	0
Construir 21 obras de mitigación para la reducción del riesgo	7	0	3	0
Beneficiar a 8.750 familias localizadas en zonas de riesgo mitigable por fenómenos de remoción en masa, con obras de mitigación	0	0	1.387	0
Promover para 2.500.000 habitantes la gestión en riesgo y adaptación al cambio climático a través de acciones de comunicación, educación y participación	2.500.000	0	872.342	0

Pagar 100 % compromisos de las vigencias anteriores fenecidas para identificar los pasivos exigibles generados del proyecto de inversión 1158	100%	0	0	0
---	------	---	---	---

## 1. CAPÍTULO 1: INFORME A LA GESTIÓN DE LAS METAS PDD Y PROYECTO

### 1.1 REASENTAR A 313 FAMILIAS LOCALIZADAS EN ZONAS DE RIESGO NO MITIGABLE.

#### 1.1.1 LOGROS IDIGER:

El Plan de Desarrollo Distrital “*Bogotá Mejor para Todos*” le encargó al IDIGER la meta de reasentar 313 familias en el marco del Programa de Reasentamientos. Meta que se ejecutó a la luz de lo dispuesto en el artículo 3 numeral 8.8 del Decreto Distrital 173 de 2014, el cual establece la función de “*Coadyuvar en la realización de los trámites para la adquisición predial de las áreas objeto de reasentamiento de familia*”.

Para la vigencia 2020 se asignó como meta reasentar 18 familias en el marco de la normatividad distrital vigente en la materia (Decreto 255/13 y Decreto 173/14). Teniendo como base que el reasentamiento es una estrategia de gestión de riesgos, dirigida a la intervención de viviendas en condiciones de alto riesgo en estratos 1 y 2 en el Distrito Capital, con el fin de proteger la vida de las familias que las habitan. El cual se puede realizar mediante alguna de las siguientes modalidades: a) Relocalización transitoria, b) Reubicación, c) Reparación o reconstrucción de la vivienda.

Por consiguiente, frente a la proyección para el primer semestre de 2020, se logró que veintidós (22) predios en zona de riesgo fueran desocupados, garantizando con ello la protección a la vida de las familias al trasladarlas de la zona de alto riesgo no mitigable.

Así mismo en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 173 de 2014, Artículo 3, función 2.4 *Actualizar y mantener el inventario de zonas de alto riesgo y el registro de familias en*

condición de riesgo sujetas a reasentamiento en el Distrito Capital. Se realizó la notificación de la condición de riesgo de las familias residentes de **114 predios**, identificados en zona de alto riesgo no mitigable por 11 Conceptos técnicos emitidos por la Subdirección de Análisis del Riesgo y Efectos del Cambio Climático; los cuales se relacionan en la siguiente tabla:

**Tabla No. 01 Notificación Condición de Riesgo**

N°	N° DE DOCUMENTO	FECHA	LOCALIDADES	BARRIO	No. PREDIOS RECOMENDADOS	TIPO DOCUMENTO	TIPO CONCEPTO
1	8692	05/02/2020	Rafael Uribe Uribe		2	CONCEPTO	REGULARIZACIÓN
2	8681	06/02/2020	Ciudad Bolívar	Los III Reyes Primera Etapa	18	CONCEPTO	REGULARIZACIÓN
3	8673	11/02/2020	Chapinero	VILLAS DEL CERRO	2	CONCEPTO	LEGALIZACIÓN
4	8663	05/02/2020	Usme	LA FLORA	33	CONCEPTO	REGULARIZACIÓN
5	8640	05/02/2020	Ciudad Bolívar	SOTAVENTO SECTORES II, III Y IV	4	CONCEPTO	ACTUALIZACIÓN
6	8573	06/02/2020	Usme	SAN PEDRO	44	CONCEPTO	REGULARIZACIÓN
8	8552	06/02/2020	Rafael Uribe Uribe	Nueva Pensilvania Sur Sctor I	2	CONCEPTO	LEGALIZACIÓN
9	8333	11/02/2020	Usme	LA FISCALA II	9	CONCEPTO	ACTUALIZACIÓN
					<b>114</b>		

**FUENTE:** Sistema de Gestión Predial y Reasentamientos - IDIGER

A partir de lo anterior, se realizó el levantamiento de información para las fichas sociales de 124 familias que fueron identificadas habitando en los predios antes mencionados.

Finalmente, se logró el desarrollo del primer módulo del Sistema de Gestión Predial “*Gestión del Reasentamiento*”, este avance permite a la entidad tener un aplicativo que agiliza los procesos de elaboración de Fichas Técnicas, Notificación y Fichas Sociales, favoreciendo la generación de información confiable y reportes oportunos.

### 1.1.2 GESTIÓN CON RECURSOS FONDIGER:

En el marco del programa de reasentamientos adelantado por el IDIGER, se logró: la entrega definitiva de veintidós (22) predios a través de recursos de FONDIGER. Con esta ejecución presupuestal, se protegió la vida de las familias residentes de las viviendas adquiridas y con ello el reasentamiento de las mismas al trasladarlas de la zona de alto riesgo no mitigable.

### 1.1.3 TABLA SOPORTE POR FUENTE DE FINANCIACIÓN:

Tabla No. 02 Soporte por fuente de financiación

ITEM	EXP.	FUENTE DE FINANCIACIÓN	OFERTA	OBJETO CONTRATO	DIRECCIÓN	CHIP	VALOR OFERTA	ESTADO DE AVANCE
1	95	FONDIGER	30550	COMPRA DE PREDIO	KR 11 ESTE 60 05 SUR	AAA0005TBTD	\$46.232.230	100%
2	641	FONDIGER	36127	COMPRA DE PREDIO	KR 27 71 J 12 SUR	AAA0261CYXS	\$131.864.210	100%
3	642	FONDIGER	36215	COMPRA DE PREDIO	KR 27 71 J 80 SUR MJ 13	AAA0266SBWW	\$58.021.698	100%
4	647	FONDIGER	36133	COMPRA DE PREDIO	CL 71K BIS 26 - 35 SUR	SIN DATO	\$67.793.806	100%
5	648	FONDIGER	36210	COMPRA DE PREDIO	CL 71K BIS 26D - 35 SUR	SIN DATO	\$34.260.523	100%
6	654	FONDIGER	36227	COMPRA DE PREDIO	CL 71 L SUR 27 - 23	AAA0209UHHN	\$111.164.495	100%
7	655	FONDIGER	36228	COMPRA DE PREDIO	CL 71 L SUR 27 - 19	SIN DATO	\$58.643.133	100%
8	701	FONDIGER	36207	COMPRA DE PREDIO	CL 71N 26-78 SUR	SIN DATO	\$53.739.680	100%
9	646	FONDIGER	36248	COMPRA DE PREDIO	CL 71 K SUR # 26D - 28	SIN DATO	\$37.948.182	100%
10	656	FONDIGER	32230	COMPRA DE PREDIO	CL 71 M SUR 27 - 22	AAA0256DBOM	\$53.777.837	100%
11	658	FONDIGER	36203	COMPRA DE PREDIO	CL 71 M SUR 27 02	SIN DATO	\$47.507.464	100%
12	699	FONDIGER	36204	COMPRA DE PREDIO	CL 71K BIS 27 - 21	AAA0189XPBR	\$49.197.217	100%
13	700	FONDIGER	36205	COMPRA DE PREDIO	CR 27 71M - 03 SUR	SIN DATO	\$18.474.575	100%

14	494	FONDIGER	34574	COMPRA DE PREDIO	CL 46 A BIS SUR 4 17 ESTE	AAA0006ECLW	\$51.588.735	100%
15	588	FONDIGER	36338	COMPRA DE PREDIO	DG 69 A SUR 18 Z 09	AAA0022WRNX	\$155.675.600	100%
16	703	FONDIGER	36232	COMPRA DE PREDIO	CL 71 M SUR 27 32	AAA0209UHMS	\$34.288.891	100%
17	749	FONDIGER	36434	COMPRA DE PREDIO	CL 72 C SUR 27 A 43	AAA0147ELAW	\$75.046.722	100%
18	653	FONDIGER	36233	COMPRA DE PREDIO	CL 71 L SUR 27 - 20	SIN DATO	\$99.178.833	100%
19	709	FONDIGER	36908	COMPRA DE PREDIO	CL 71N 26D 80 SUR	SIN DATO	\$19.731.254	100%
20	644	FONDIGER	36133	COMPRA DE PREDIO	KR 27 71 J 80 SUR MJ 14	AAA0266SBXS	\$16.247.065	100%
21	645	FONDIGER	36218	COMPRA DE PREDIO	CL 71 F SUR 27 A 29	SIN DATO	\$36.847.389	100%
22	702	FONDIGER	36247	COMPRA DE PREDIO	KR 27 71J 08 SUR	AAA0266SBYN	\$17.195.721	100%

FUENTE: Base de Reasentamientos Adquisición Predial IDIGER

#### 1.1.4 RETRASOS:

Durante el periodo no se presentaron retrasos para el cumplimiento de la meta, toda vez que se cumplió con lo comprometido.

#### 1.1.5 SOLUCIONES:

No se requirieron soluciones, teniendo en cuenta que para el periodo no se presentaron retrasos, ni dificultades con el cumplimiento de la meta.

### 1.1.6 BENEFICIOS PARA LA CIUDADANÍA:

- 22 familias dejaron de habitar en condición de alto riesgo no mitigable, con lo cual se protegió la vida a estas personas.
- A las familias que están por fuera del polígono de riesgo, sin embargo, habitan en la zona perciben una mejoría en las garantías de seguridad de la zona.

### 1.1.7 REGISTRO FOTOGRAFICOS



**Nombre:** Notificación de la condición de Riesgo a familias

**Fecha:** Marzo 11 de 2020

**Lugar:** Barrio La Fortuna, Usme



**Nombre:** Seguimiento a familias en proceso de Reasentamiento  
**Fecha:** Marzo 2 de 2020  
**Lugar:** Barrio Libertadores, San Cristóbal



**Nombre:** Equipo interdisciplinario de Reasentamiento  
**Fecha:** Febrero 26 de 2020  
**Lugar:** Barrio La Flora, Usme



**Nombre:** Notificación Condición de Riesgo a familias ubicadas en zonas de alto riesgo no mitigable  
**Fecha:** Febrero 19 de 2020  
**Lugar:** Barrio San Pedro, Usme



**Nombre:** Notificación de oferta para adquisición de predio en proceso de Reasentamiento

**Fecha:** Junio 5 de 2020

**Lugar:** Oficina principal IDIGER

#### 1.1.8 SOPORTES DE LOS AVANCES REGISTRADOS:

Los soportes de los avances alcanzados durante el primer semestre de 2020, se pueden identificar a través del siguiente link:

<https://drive.google.com/drive/folders/12T2HwzYC26OPKkVl3CoZbVJtuOvBATez>,

### 1.2 CONSTRUIR 21 OBRAS DE MITIGACIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO.

#### 1.2.1 LOGROS IDIGER:

Para el cumplimiento y seguimiento a la meta Plan de Desarrollo, la entidad identificó y formuló el proyecto de inversión “Reducción del riesgo y adaptación al cambio climático” y se estableció la meta de “Construir 17 Obras de Mitigación para la Reducción del Riesgo” de las cuales desde el 2016 y hasta la fecha del presente reporte se han ejecutado 21, se encuentran 4 obras en ejecución y 1 en etapa precontractual, las cuales se relacionan a continuación:

**1. Monserrate - Ejecutada - 100%**

Construcción de obras para la mitigación del riesgo y protección del sector norte sendero peatonal al santuario de Monserrate.

**2. Altos de la Estancia Cerramiento Fase 2 - Ejecutada - 100%**

Realizar la segunda fase del cerramiento perimetral y obras complementarias, del parque especial de suelo de protección por riesgo Alto de la Estancia, como estrategia para la recuperación, control y mitigación de riesgos en la zona.

**3. Moralba - Ejecutada - 100%**

Construcción de obras de mitigación mediante técnicas de bioingeniería para el manejo de aguas superficiales y subsuperficiales, en el polígono correspondiente a la manzana 12 del barrio Moralba de la localidad de San Cristóbal.

**4. Monserrate Fase 3 - Ejecutada - 100%**

Construcción de las obras de protección para el control de erosión (fase 3) e instalación de cerramiento de restricción para peatones en la parte alta del sendero peatonal de acceso al santuario de Monserrate.

**5. El Bosque - Ejecutada - 100%**

Construcción de las obras de estabilización del talud en la transversal 5 Este, con calle 87 Bis Sur, vía Colegio Distrital Ofelia Uribe, barrio el Bosque de la localidad de Usme en Bogotá D.C.

**6. Monterrey - Ejecutada - 100%**

Construcción de las obras de emergencia para la mitigación de riesgo por desprendimientos de rocas en el sector de la calle 75 B sur con carrera 14 en el barrio Monterrey de la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá D.C.

**7. Brisas del Volador - Ejecutada - 100%**

Construcción de las obras complementarias de estabilización en el barrio Brisas del Volador, entre las calles 70 B Sur y 70 F Sur y la transversal 22 Bis y la carrera 23 A de la localidad de Ciudad Bolívar.

#### **8. Altos de la Estancia Bermas 4 y 5 - Ejecutada - 100%**

Construcción de las obras de estabilización y drenaje en el polígono altos de la estancia fase 3 sector inferior La Carbonera localidad Ciudad Bolívar en Bogotá D.C.

#### **9. Juan José Rondón - Ejecutada - 100%**

Construcción de las obras de mitigación en el polígono ubicado entre la transversal 20 F y transversal 20 C y las calles 68 G Bis Sur y calle 69 Sur, en el barrio Juan José Rondón en la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá D.C.

#### **10. Brisas del Volador segunda Fase - Ciudad Bolívar - Ejecutada - 100%**

Construcción de las obras complementarias de estabilización segunda fase, en el barrio Brisas del Volador, entre las calles 70 B Sur y 70 F Sur y la transversal 22 Bis y la carrera 23 A de la localidad de Ciudad Bolívar.

#### **11. Madrid - Ejecutada - Rafael Uribe Uribe - 100%**

Construcción de las obras de mitigación de riesgo para el control de erosión en el barrio Madrid, entre las carreras 8 y 9 con calle 39 C Sur y 39 D Sur etapa I, de la localidad de Rafael Uribe Uribe en la ciudad de Bogotá “

#### **12. Sotavento -Ciudad Bolívar- Ejecutada - 100%**

Construcción de las obras de mitigación por procesos de remoción en masa en el barrio Sotavento nuevo sector, entre las calles 73 B Sur y 74 B Sur con carrera 18 C y 18 C Bis en la localidad de Ciudad Bolívar de la ciudad de Bogotá D.C.

#### **13. El Codito- Usaquéen- Ejecutada - 100%**

Construcción de las obras de mitigación por desprendimiento de rocas en el polígono comprendido entre las calles 181 y 182 A, entre carreras 3 A y 6 en barrio El Codito, de la localidad de Usaquén, en Bogotá D.C.

#### **14. Casagrande - Ciudad Bolívar- Ejecutada - 100%**

Construcción de las obras de mitigación de riesgo en el barrio los tres reyes, entre las calles 62 D Sur y calles 62 G Sur y las carreras 76 B y carreras 76 D - sector Casagrande, de la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá D.C.

#### **15. Arabia - Ciudad Bolívar- Ejecutada - 100%**

Diseño y construcción de las obras de emergencia para la mitigación del riesgo por remoción en masa presentado en el barrio Arabia de la UPZ El Tesoro de la localidad de Ciudad Bolívar de Bogotá D.C.

#### **16. Parque Porvenir -Usme- Ejecutada - 100%**

Construcción de las obras de mitigación de riesgo en el Parque Porvenir II, a la altura de la calle 66 A Sur, entre carreras 11 Bis Este y carrera 2 Este, en la localidad de Usme, Bogotá D.C.

#### **17. Serranías -Usme- Ejecutada - 100%**

Construcción de las obras de mitigación de riesgo en el barrio Serranías, comprendido en el talud ubicado en el costado sur-oriente de la calle 97 Sur entre la carrera 7 A y carrera 7 C de la localidad de Usme, en Bogotá Distrito Capital

#### **18. Juan José Rondón Usme - Ejecutada - 100%**

Construcción de las obras de mitigación de riesgo en el parque porvenir II, a la altura de la calle 66 A Sur, entre carreras 11 Bis Este y carrera 2 Este, en la localidad de Usme, en Bogotá D.C.

### **19. Caracolí Ciudad Bolívar - Ejecutada - 100%**

Diseño y construcción de las obras de emergencia para la mitigación del riesgo por flujo de material presentado en el en el sector de la calle 76 Bis Sur entre carreras 73 B y 73 C y su área de influencia en él.

### **20. Granjas de San Pablo - Ejecutada - 100%**

Construcción de las obras de mitigación de riesgo, demolición y reconfiguración de varios predios ubicados dentro del polígono comprendido entre las carreras 16 Bis y carrera 16 Bis B y las calles 40 Sur y calle 41 Sur en el barrio Granjas de San Pablo, de la localidad Rafael Uribe Uribe, en Bogotá D.C. Barrio Caracolí de la Localidad De Ciudad Bolívar De Bogotá D.C.

### **21. Monterrey Ciudad Bolívar - Ejecutada - 100%**

Construcción de las obras complementarias (Fase III) en la parte media del talud para evitar el avance del proceso erosivo incluyendo la revisión de las obras de drenaje y subdrenaje en el sector de la calle 75 B Sur con carrera 14 A, barrio Monterrey de la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá D.C.

### **22. Parque Nacional Chapinero - En ejecución - 59%**

Construcción de las obras de mitigación de riesgo en el Parque Nacional, entre la calle 40 A Bis con transversal 2 en el tramo inicial Río Arzobispo, de la Localidad de Chapinero, en Bogotá D.C

### **23. Divino Niño Ciudad Bolívar - En ejecución - 97%**

Construcción de las obras para la mitigación del riesgo por remoción en masa presentado en el Barrio Divino Niño en el sector comprendido entre la calle 80 Bis A Sur y Calle 80 A Bis A Sur y la Carrera 16 y la Quebrada Trompeta y su área de influencia en la Localidad de Ciudad Bolívar de Bogotá D.C.

**24. San Martín de Porres Chapinero - - En ejecución - 17%**

Diseño y construcción de las obras localizadas al costado occidental de la carrera 4 Este entre calles 45 C y 45 F, para evitar afectación a la infraestructura localizada sobre esta vía y a las viviendas aledañas, dado el carácter retrogresivo y avance del movimiento en masa presentado de la localidad en la Localidad de Chapinero en Bogotá D.C.

**25. Peñón del Cortijo Ciudad Bolívar - En ejecución - 6%**

Construcción de la primera fase de las obras de mitigación de riesgo en el barrio el Peñón del Cortijo III sector en la localidad de Ciudad Bolívar de la Ciudad de Bogotá D.C.

**26. Delicias del Carmen Ciudad Bolívar - En etapa precontractual**

Construcción de las obras mitigación en el sector Delicias del Carmen, en la localidad de Usaquén de la ciudad de Bogotá.

**1.2.2 GESTIÓN CON RECURSOS FONDIGER**

A continuación, se presenta la información detallada de los procesos en curso financiadas con recursos FONDIGER:

**Tabla No. 03 Procesos en curso recursos FONDIGER**

ÍTEM	NOMBRE DEL PRODUCTO	FUENTE IDIGER /FONDIGER	CTO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	ESTADO O PORCENTAJE AVANCE
------	---------------------	-------------------------	-----	---------------------	-------	----------------------------

	Divino Niño	FONDIGER	488-2019	Construcción de las obras de emergencia para la mitigación del riesgo por remoción en masa presentado en el barrio Divino Niño en el sector comprendido entre la calle 80 Bis A Sur y calle 80 A Bis A Sur y la carrera de 16 y la quebrada Trompeta sector 1 y fase 1 y 2, y su área de influencia en la Localidad de Ciudad Bolívar de Bogotá Distrito Capital, en el marco de las resoluciones 411 y 650 de 2019	\$ 2.781.353.206	En ejecución
	Interventoría Divino Niño	FONDIGER	489-2019	Interventoría, administrativa, técnica, financiera, social y ambiental para la construcción de las obras de emergencia para la mitigación de riesgo por remoción en masa presentado en el barrio Divino Niño en el sector comprendido entre la calle 80 Bis A Sur y calle 80 A Bis A Sur y la carrera de 16 y la quebrada Trompeta sector 1 y fase 1 y 2, y su área de influencia en la Localidad de Ciudad Bolívar de Bogotá Distrito Capital, en el marco de las resoluciones 411 y 650 de 2019	\$ 249.776.240	En ejecución
9	Parque Nacional	FONDIGER	458-2019	Construcción de las Obras de Mitigación de Riesgo en el Parque Nacional, entre la calle 40A Bis con Transversal 2 del tramo inicial Río Arzobispo, de la Localidad de Chapinero, en Bogotá Distrito Capital	\$ 1.124.203.031	Suspendida temporalmente
	Interventoría Parque Nacional	FONDIGER	464-2019	Interventoría, administrativa, técnica, jurídica, financiera, social y ambiental para la construcción de las obras de mitigación de riesgo en el Parque Nacional, entre la calle 40A Bis con Transversal 2 del tramo inicial Río Arzobispo, de la Localidad de Chapinero, en Bogotá Distrito Capital	\$ 165.150.580	Suspendida temporalmente
	San Martin de Porres	FONDIGER	516 de 2019	Diseño y construcción de las obras localizadas al costado occidental de la carrera 4 Este entre calles 45 C y 45 F, para evitar afectación a la infraestructura localizada sobre esta vía y a las viviendas aledañas, dado el carácter retrogresivo y avance del movimiento en masa presentado de la localidad en la Localidad de Chapinero en Bogotá D.C.	\$ 1.294.594.102,00	En ejecución
	Interventoría San Martin de Porres	FONDIGER	517 de 2020	Diseño y construcción de las obras localizadas al costado occidental de la carrera 4 Este entre calles 45 C y 45 F, para evitar afectación a la infraestructura localizada sobre esta vía y a las viviendas aledañas, dado el	\$ 198.313.500,00	En ejecución

				carácter retrogresivo y avance del movimiento en masa presentado de la localidad en la Localidad de Chapinero en Bogotá D.C.		
	Peñón del cortijo	FONDIGER	004 de 2020	Interventoría, administrativa, técnica, jurídica, financiera, social y ambiental para el diseño y construcción de las obras localizadas al costado occidental de la carrera 4 Este entre calles 45 C y 45 F, para evitar afectación a la infraestructura localizada sobre esta vía y a las viviendas aledañas, dado el carácter retrogresivo y avance del movimiento en masa presentado de la localidad en la Localidad de Chapinero en Bogotá D.C.	\$ 2.923.996.985	Suspendida temporalmente
	interventoría Peñón del cortijo	FONDIGER	002 de 2020	Interventoría, administrativa, técnica, jurídica, financiera, social y ambiental para el diseño y construcción de las obras localizadas al costado occidental de la carrera 4 Este entre calles 45 C y 45 F, para evitar afectación a la infraestructura localizada sobre esta vía y a las viviendas aledañas, dado el carácter retrogresivo y avance del movimiento en masa presentado en la localidad de Chapinero en Bogotá D.C.	3319.567.360	Suspendida temporalmente

### 1.2.3 TEMAS PRIORITARIOS PARA EL PRÓXIMO PERIODO

- Concluir la ejecución de las obras en curso correspondientes a Parque Nacional - Chapinero; San Martín de Porres – Chapinero, Divino Niño - Ciudad Bolívar y Peñón del Cortijo - Ciudad Bolívar
- Gestión contractual y posterior ejecución del proceso de Delicias del Carmen – Usaquén.
- Gestión contractual y posterior ejecución de los nuevos procesos definidos en el nuevo Plan de Desarrollo.

### 1.2.4 RETRASOS Y SOLUCIONES

Para el periodo dado las directrices impartidas por el Gobierno Nacional y las autoridades locales en el marco de la emergencia sanitaria por COVID 19, se suspendieron temporalmente las obras, posteriormente el pasado 25 de mayo se dió reinicio a dos obras. No obstante se suspendieron las actividades de socialización de presentación y avance de obras a las comunidades.

### **1.2.5 BENEFICIOS PARA LA CIUDADANÍA**

Con la construcción de las veintiún (21) obras se han beneficiado a 11.871 familias vulnerables, con la culminación de las tres obras (3) para la vigencia Granjas de San Pablo - Rafael Uribe Uribe, Monterrey Ciudad Bolívar y Caracolí Ciudad Bolívar, se beneficiaron 1.387 familias y con las que se encuentran actualmente en ejecución Parque Nacional, Divino niño y San Martin de Porres, Peñon del cortijo se espera beneficiar a cerca de 1.230 familias a través la construcción de las obras de mitigación en los barrios de la ejecución de las obras en curso correspondientes a Parque Nacional - Chapinero; San Martín de Porres – Chapinero, Divino Niño - Ciudad Bolívar y Peñón del Cortijo - Ciudad Bolívar, en las que se incluyen la construcción de muros, anclajes, perfilado de taludes que fueron complementadas con obras de manejo de drenaje que permitieron reducir los factores generadores de inestabilidad de las zonas intervenidas.

### **1.2.6 REGISTRO FOTOGRÁFICO**

#### **Divino Niño Ciudad Bolívar - En ejecución - 97%**

Construcción de las obras para la mitigación del riesgo por remoción en masa presentado en el Barrio Divino Niño en el sector comprendido entre la calle 80 Bis A Sur y Calle 80 A Bis A Sur y la Carrera 16 y la Quebrada Trompeta y su área de influencia en la Localidad de Ciudad Bolívar de Bogotá D.C.



### **Parque Nacional Chapinero - En ejecución - 59%**

Construcción de las obras de mitigación de riesgo en el Parque Nacional, entre la calle 40 A Bis con transversal 2 en el tramo inicial Rio Arzobispo, de la Localidad de Chapinero, en Bogotá D.C



### **San Martín de Porres Chapinero - En ejecución - 17%**

Diseño y construcción de las obras localizadas al costado occidental de la carrera 4 Este entre calles 45 C y 45 F, para evitar afectación a la infraestructura localizada sobre esta vía y a las viviendas aledañas, dado el carácter retrogresivo y avance del movimiento en masa presentado de la localidad en la Localidad de Chapinero en Bogotá D.C.



### **Peñón del Cortijo Ciudad Bolívar - En ejecución - 6%**

Construcción de la primera fase de las obras de mitigación de riesgo en el barrio el Peñón del Cortijo III sector en la localidad de Ciudad Bolívar de la Ciudad de Bogotá D.C.



**Delicias del Carmen Ciudad Bolívar - En etapa precontractual**

Construcción de las obras mitigación en el sector Delicias del Carmen, en la localidad de Usaquén de la ciudad de Bogotá Distrito Capital.



**1.3 BENEFICIAR A 8.750 FAMILIAS LOCALIZADAS EN ZONAS DE RIESGO MITIGABLE POR FENÓMENOS DE REMOCIÓN EN MASA, CON OBRAS DE MITIGACIÓN**

**1.3.1 LOGROS IDIGER**

Con la construcción de las veintiún (21) obras para el periodo comprendido entre el año 2016- 2020 se han beneficiado a más de 11.871 familias en las diferentes localidades de Bogotá así:

**Tabla No. 04 Familias beneficiadas vs año**

Año	Familias beneficiadas
-----	-----------------------

2016	0
2017	2431
2018	2412
2019	5599
2020	1.387
TOTAL	11.871

Con la construcción de las veintiún (21) obras se han beneficiado a 11.871 familias vulnerables, con la culminación de las cuatro obras (4) para la vigencia 2020; Juan Jose Rondon Usme Granjas de San Pablo - Rafael Uribe Uribe, Monterrey Ciudad Bolívar y Caracolí Ciudad Bolívar, se beneficiaron 1.387 familias y con las que se encuentran actualmente en ejecución Parque Nacional, Divino niño y San Martín de Porres, Peñon del cortijo se espera beneficiar a cerca de 1.230 familias a través la construcción de las obras de mitigación en los barrios de la ejecución de las obras en curso correspondientes a Parque Nacional - Chapinero; San Martín de Porres – Chapinero, Divino Niño - Ciudad Bolívar y Peñón del Cortijo - Ciudad Bolívar, en las que se incluyen la construcción de muros, anclajes, perfilado de taludes que fueron complementadas con obras de manejo de drenaje que permitieron reducir los factores generadores de inestabilidad de las zonas intervenidas.

De igual manera en el proceso de logra:

- La apropiación de la comunidad de las obras realizadas.
- La participación de la comunidad en los espacios de participación ofrecidos durante de la ejecución de las obras.

### 1.3.2 RETRASOS Y SOLUCIONES

Para el periodo dado las directrices impartidas por el Gobierno Nacional y las autoridades locales en el marco de la emergencia sanitaria por COVID 19, se suspendieron temporalmente las obras, posteriormente el pasado 25 de mayo se dió reinicio a dos obras.

No obstante se suspendieron las actividades de socialización de presentación y avance de obras a las comunidades.

### 1.3.3 **BENEFICIOS PARA LA CIUDADANÍA**

Para el primer semestre del 2020, se beneficiaron a 1387 familias y se espera beneficiar 1.230 familias a través la construcción de las obras de mitigación en los barrios de la ejecución de las obras en curso correspondientes a Parque Nacional - Chapinero; San Martín de Porres – Chapinero, Divino Niño - Ciudad Bolívar y Peñón del Cortijo - Ciudad Bolívar, en las que se incluyen la construcción de muros, anclajes, perfilado de taludes que fueron complementadas con obras de manejo de drenaje que permitieron reducir los factores generadores de inestabilidad de las zonas intervenidas.

### 1.3.4 **REGISTRO FOTOGRÁFICO**

Construcción de las obras para la mitigación del riesgo por remoción en masa presentado en el barrio Divino Niño en el sector comprendido entre la calle 80 Bis A Sur y Calle 80 A Bis A Sur y la Carrera 16 y la quebrada Trompeta y su área de influencia en la localidad de Ciudad Bolívar de Bogotá D.C



#### **1.4 PROMOVER PARA 2.500.000 HABITANTES LA GESTIÓN EN RIESGO Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO A TRAVÉS DE ACCIONES DE COMUNICACIÓN, EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN**

##### **1.4.1 EDUCACIÓN**

En el marco de las actividades desarrolladas durante el periodo es necesario destacar la implementación de jornadas presenciales y virtuales de transferencia de conocimientos sobre la gestión del riesgo y manejo de la plataforma SURE dirigido a los supervisores de las Direcciones Locales de Educación -DILE- y a docentes responsables de la Gestión del

Riesgo de Desastres en instituciones educativas de primera infancia, infancia y adolescencia, cuyo porcentaje de diligenciamiento de los Planes Escolares de Gestión del Riesgo - PEGRCC en la plataforma SURE se encuentran por debajo del 20%.

Estas jornadas han tenido como temática de abordaje las siguientes:

- a. Introducir los conceptos básicos de la Gestión del Riesgo de Desastres y el Cambio Climático.
- b. Socializar el marco normativo general a nivel nacional y distrital sobre la Política Nacional de la Gestión del Riesgo de Desastres.
- c. Referencia general a los escenarios de riesgo de Bogotá
- d. Ejercicio práctico sobre el Sistema Único de Registro Escolar -SURE-, plataforma dispuesta para la presentación de los Planes Escolares de Gestión de Riesgos de Desastres y Cambio Climático en el Distrito Capital.

Adicionalmente, en respuesta a una solicitud realizada por el Consejero Local de Engativá, el IDIGER y específicamente el área de Educación e Investigación participó en el proceso de transferencia de conocimientos en gestión del riesgo para personas con discapacidad de la localidad, en el cual participaron también diferentes entidades del Consejo Local de Gestión del Riesgo.

Para dicha actividad, desde el área de Educación se realizó el diseño e implementación de la primera sesión sobre conceptos básicos de gestión del riesgo de desastres y se acompañó y apoyó la segunda sesión sobre simulacros a cargo del área de capacitación y entrenamiento.

Es importante destacar que se realizó una fase de evaluación del proceso con instituciones expertas en el tema, como lo son RENACER (instituto de atención y protección a jóvenes con discapacidad cognitiva) y el Instituto Nacional de Ciegos INCI) con quienes se realizó retroalimentación de la metodología y ayudas pedagógicas empleadas.

Por otra parte, se inició un acercamiento con entidades de investigación ambiental con el fin de conocer experiencias institucionales en esta materia, que le permitan al IDIGER clarificar los requerimientos e implicaciones de este tipo de procesos para ir avanzando

hacia el cumplimiento del Acuerdo Distrital 617 de 2015 y las metas establecidas en el Plan Distrital De Gestión de Riesgos y Adaptación al Cambio Climático.

Resultado de esta gestión, se adelantaron encuentros con profesionales de la Subdirección de Investigaciones del Instituto Alexander Von Humboldt. Allí se abordaron interrogantes sobre los requisitos organizacionales, técnicos y financieros necesarios para diseñar e implementar un programa de investigación para la gestión de riesgos de desastres y la gestión del cambio climático en la ciudad de Bogotá. También se abordaron las consideraciones para la creación de un esquema de estímulos para la investigación en estas temáticas.

#### **1.4.1.1 LOGROS IDIGER:**

El Instituto por primera vez realizó el diseño e implementación de un proceso inclusivo de transferencia de conocimientos, generando aprendizajes que le permitirán reflexionar sobre la necesidad de hacer transversal el abordaje inclusivo y a su vez aportar para la elaboración de metodologías pertinentes para la población con discapacidad.

Participación de 40 personas con discapacidad visual, auditiva, cognitiva y psicosocial en la sesión presencial de transferencia de conocimientos en conceptos básicos sobre gestión del riesgo de desastres.

Implementación de las primeras sesiones virtuales sobre conceptos y normatividad en gestión del riesgo y manejo del SURE dirigidas a Instituciones Educativas, con un número de participantes mayor que en las actividades de transferencias de conocimientos presenciales, contando en la primera sesión virtual con un total de 50 supervisores de las diferentes DILES del distrito y en la segunda sesión dirigida a docentes con un total de 69 participantes en comparación con 26 participantes presenciales en la sesión dirigida a instituciones educativas de la DILE de Los Mártires.

Implementación exitosa de herramientas virtuales para mantener contacto con los grupos de interés y con los grupos de valor.

#### **1.4.1.2 GESTIÓN CON RECURSOS FONDIGER.**

No aplica

### 1.4.1.3 TABLA SOPORTE POR FUENTE DE FINANCIACIÓN

No aplica

### 1.4.1.4 RETRASOS:

Las actividades *Fortalecer las capacidades para la gestión del riesgo y la adaptación al cambio climático* relacionadas con la **META 03 - Promover para 2500000 habitantes la gestión de riesgos y adaptación al cambio climático a través de acciones de comunicación, educación y participación**, no presentan ningún tipo de retraso.

### 1.4.1.5 SOLUCIONES

Considerando que no se presentaron retrasos no fue necesario la búsqueda ni implementación de soluciones.

### 1.4.1.6 BENEFICIOS PARA LA CIUDADANÍA

Acceso a información sobre Gestión de Riesgos relacionada con: conceptos básicos, marco normativo, escenarios de riesgos para Bogotá D.C.

Continuidad en la orientación a las DILES e instituciones educativas respecto a los PEGRCC y al manejo del SURE.

Empleo de herramientas virtuales desde el área de Educación, que permiten a los grupos de interés y de valor, mantenerse en contacto y absolver dudas y recibir orientación e información sobre gestión del riesgo.

### 1.4.1.7 REGISTRO FOTOGRAFICOS



**Capacitación Loc Engativá - Personas con Discapacidad**


Fuente: Área Educación e Investigación

Fecha: 24 de enero de 2020



Fuente: Área Educación e Investigación

Fecha: 24 de enero de 2020

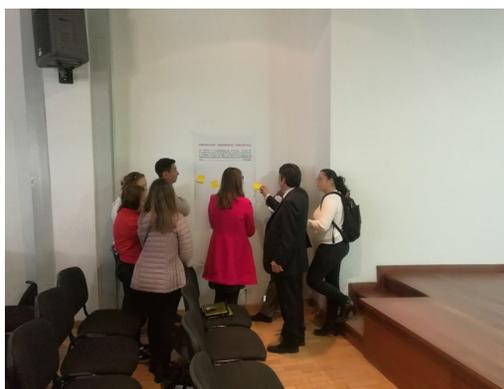

**Capacitación Colegios Loc. Los Mártires**



Fuente: Área Educación e Investigación

Fecha: 10 de marzo de 2020

**Capacitación Colegios Loc. Los Mártires**

Fuente: Área Educación e Investigación

Fecha: 10 de marzo de 2020

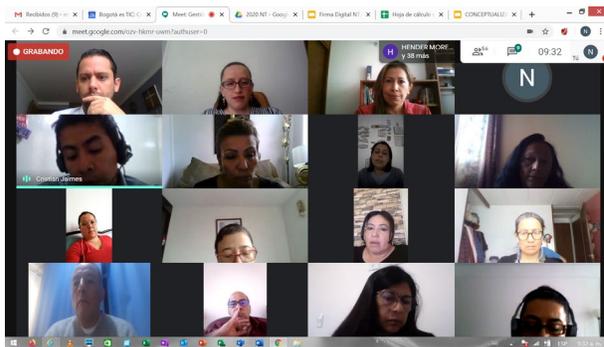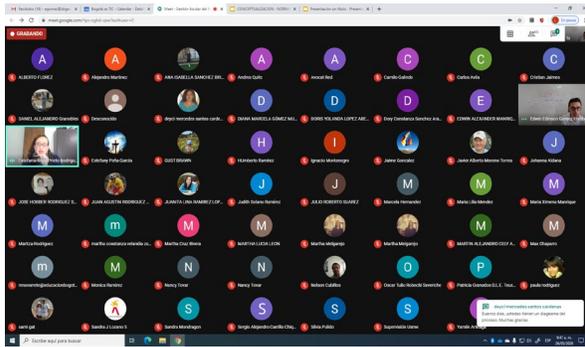

**Hablemos de Gestión Escolar del Riesgo y Cambio Climático**  
**Cambio Climático**

**Charla a Supervisores de Educación de Bogotá - 20 Localidades**  
**en el SURE**

**Fuente: Área Educación e Investigación**

**Fecha: 26/05/2020. Google Meet**

**Hablemos de Gestión Escolar del Riesgo y**

**Charla a Instituciones Educativas con % bajo en**

**Fuente: Área Educación e Investigación**

**Fecha: 28/05/2020. Google Meet**



Reunión IDIGER - Instituto de Investigación de Recursos Biológicos de Recursos Biológicos

Alexander von Humboldt

Fecha: 14 de mayo de 2020

2020

Google Meet

Reunión IDIGER - Instituto de Investigación

Alexander von Humboldt

Fecha: 20 de mayo de

Google

Meet

#### 1.4.1.8 SOPORTES DE LOS AVANCES REGISTRADOS

1. Lista de convocados a la Capacitación Localidad Engativá - Personas con Discapacidad
2. Lista de Asistencia Capacitación Colegios Localidad Los Mártires
3. Meet Attendance e Invitación a la Capacitación a los Supervisores de las DILES de la Secretaría de Educación - SED
4. Meet Attendance de las dos sesiones de reunión con el Instituto Von Humboldt.
5. Meet Attendance e Invitación a la Capacitación de los Colegios de distintas localidades, con el menor porcentaje de diligenciamiento en la Plataforma SURE.

## 1.4.2 COMUNICACIONES

El Equipo de Comunicaciones tiene la tarea de asegurar la coherencia en el mensaje social del IDIGER, así como proponer las herramientas prácticas en la planificación y elaboración de una estrategia de comunicación y sus diferentes canales para visibilizar la gestión que realiza. Articulando y proyectando todos los elementos para lograr el éxito de la comunicación institucional, y conformando el eje central que estructura todos los mensajes y acciones de la entidad.

Además, a través de sus estrategias y campañas refuerza los mensajes que la administración distrital desea que sus colaboradores apropien en sus lugares de trabajo.

Los mensajes institucionales coinciden con un lenguaje claro e incluyente, los medios de comunicación, las redes sociales, las aglomeraciones de público, las campañas de transporte vertical, apoyan e impulsan la difusión de los contenidos, mensajes y noticias que la entidad debe resaltar.

Esta área funcional, realiza un trabajo constante en gestión y contacto con los medios de comunicación para lograr el posicionamiento de la entidad y divulgación de mensajes y contenidos relacionados con la misionalidad del IDIGER.

Con el permanente monitoreo en medios de comunicación se define la percepción de las comunidades y permite planear el direccionamiento de los mensajes a las comunidades objetivo.

### 1.4.2.1 LOGROS IDIGER

Se ha impulsado al IDIGER a través de los medios de comunicación, como una entidad efectiva, confiable e inmediata para los ciudadanos.

- Se realizó la difusión y posicionamiento de las campañas de gestión del riesgo y adaptación al cambio climático en los primeros meses del año.

· Posicionamiento de la entidad desde su gestión en la atención a la comunidad, a través de la página web, de las cuentas oficiales en redes sociales (Twitter, Facebook, Instagram y YouTube) y del apoyo en los medios de comunicación.

· Permanente información oportuna, clara y veraz a todos los servidores del IDIGER a través de los canales de comunicación interna, facilitando el entendimiento de los procesos para fortalecer la imagen institucional, el sentido de pertenencia y para comunicar el accionar de las demás entidades distritales.

#### 1.4.2.2 **GESTIÓN CON RECURSOS FONDIGER**

No aplica

#### 1.4.2.3 **TABLA SOPORTE POR FUENTE DE FINANCIACIÓN**

No aplica

#### 1.4.2.4 **RETRASOS**

Las actividades relacionadas no presentan retrasos

#### 1.4.2.5 **SOLUCIONES**

No aplica

#### 1.4.2.6 **BENEFICIOS PARA LA CIUDADANÍA**

La difusión de mensajes a empresas privadas y entidades públicas para prepararse ante una situación de emergencia, permiten sumar esfuerzos y posicionar al IDIGER como entidad gestora y promotora del conocimiento del riesgo.

Difusión de mensajes de prevención para la primera temporada de lluvias y de autoprotección durante la pandemia.

Acceso a información con la difusión de mensajes claros y precisos sobre atención y procesos, en los medios digitales y tradicionales.

**1.4.2.7 REGISTRO FOTOGRAFICOS:**



**Equipo de Respuesta a Emergencias - Enero de 2020**



**Mesa interinstitucional de emergencias - llluvias - Febrero 2020**



**Mesa de manejo de emergencias - Marzo 2020**



**Vendaval en el barrio 20 de Julio**



**PMU - Emergencia sanitaria por Coronavirus**



**Lanzamiento Bogotá Solidaria en Casa**



**Bogotá Solidaria en Casa**



**Coordinación entrega de ayudas humanitarias**



**Entrega de mercados**

#### 1.4.2.8 SOPORTES DE LOS AVANCES REGISTRADOS:

- Indicadores en las redes sociales oficiales de la entidad (Twitter, Facebook, Instagram y YouTube) con el alcance de nuevos seguidores.
- Monitoreo de noticias donde se evidencia el número de notas publicadas con información de la entidad.

### 1.4.3 GESTIÓN LOCAL

#### 1.4.3.1 LOGROS IDIGER

Planes de Acción de los CLGR-CC: Dentro de los logros obtenidos por parte del área, se encuentra la aprobación de los 20 planes de acción ante los miembros de los CLGR-CC y la incorporación de actividades complementarias de cara a la gestión del riesgo.

Los Consejos Locales de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (CLGR-CC), cuentan con un instrumento de planeación y seguimiento de sus intervenciones, a partir de los lineamientos emitidos por el IDIGER; esto con el propósito de que las veinte localidades avancen hacia objetivos comunes en torno a la gestión del riesgo en el Distrito Capital, y de realizar seguimiento comparativo entre los avances locales, las dificultades y retos que deben tenerse en cuenta para la fortalecimiento de las capacidades institucionales, sociales y comunitarias, que den como resultado la reducción del riesgo efectiva en las localidades de la Ciudad.

**Operativos:** El área de Gestión Local ha realizado un importante aporte en el desarrollo de las acciones asociadas a la atención de la pandemia por COVID-19, han sido el contacto con la ciudadanía e institucionalidad en campo. Es de destacar la coordinación de los Puestos de Mando Unificado de las zonas de protección especial en seis localidades, con más de 15 polígonos de atención; Apoyo a los PMU de Altos de la Estancia, Entre

Nubes y Yopal Pedregal; así como las actividades de entrega de mercados y caracterización de familias de la Secretaría Distrital de Hábitat.

**Planes Locales de Gestión de Riesgos y Cambio Climático:** Actualmente se cuenta con 20 PLGR/CC, de los cuales 19 se encuentran adoptados por acto administrativo, así mismo se cuenta con documentos de caracterización de 89 escenarios de riesgo y más de 1.027 acciones del componente programático (327 acciones de conocimiento, 405 acciones de reducción, 154 acciones de manejo de emergencias, 73 acciones de protección financiera, entre otras).

**Consejos Locales de Gestión de Riesgos y Cambio Climático CLGR-CC:** En el primer semestre, se ha ejercido la Secretaría Técnica en 97 Consejos con su respectivo plan de acción aprobado, cuya estructura se basa en los procesos de la gestión del riesgo.

**1 Actividades de Participación Comunitaria:** Durante el primer semestre, se han llevado a cabo actividades de sensibilización de cara a la gestión del riesgo con la participación de 603 ciudadanos de las localidades de Suba, Ciudad Bolívar, Los mártires, Fontibón, Kennedy, San Cristóbal, Teusaquillo, Tunjuelito y Bosa, los cuales hoy cuentan con el conocimiento en temas relacionados con la prevención de riesgos y manejo de desastres. Es de aclarar que en el mes de marzo no se llevaron a cabo actividades de participación por terminación de contratos.

**1 Lo anterior discriminado mes a mes en la siguiente tabla:**

**Tabla No. 05 Personas informadas 2019 Gestión Local**

Mes	No, de Personas
Enero	84
Febrero	71
Marzo	0
Abril	29
Mayo	419

**Actividades en el marco del Covid-19:** El equipo de gestión ha sido muy importante en el desarrollo de las acciones asociadas a la atención de la pandemia por COVID-19, han sido el contacto con la ciudadanía e institucionalidad en campo. Es de destacar la coordinación de los Puestos de Mando Unificado de las zonas de protección especial en seis localidades, con más de 15 polígonos de atención; Apoyo a los PMU de Altos de la Estancia, Entre Nubes y Yopal Pedregal; así como las actividades de entrega de mercados y caracterización de familias de la Secretaría Distrital de Hábitat.

**Asistencia Técnica y Formulación del PDL:** Actualmente se avanza en el proceso de asistencia técnica para la formulación del componente de gestión de riesgos y cambio climático en los Planes de Desarrollo Local, articulando las acciones del componente programático de los PLGR/CC a los programas y metas locales.

Adicionalmente se ha realizado la socialización de los PLGR/CC en los Consejos de Planeación Local, las Juntas Administradoras Locales y los encuentros ciudadanos.

Las Alcaldías locales cuentan con asistencia en la formulación de los proyectos de inversión y la aplicación de las líneas de inversión local.

#### 1.4.3.2 **GESTIÓN CON RECURSOS FONDIGER**

La actividad realizada por el área de Gestión Local no implica utilización de recursos FONDIGER, por lo tanto, no se reporta esta información.

#### 1.4.3.3 **TABLA SOPORTE POR FUENTE DE FINANCIACIÓN**

No aplica fuente de financiación para el presente informe.

#### 1.4.3.4 **RETRASOS**

Aunque no ha representado retrasos para la gestión local, es importante tener en cuenta que la demora en la contratación en algunas de las Entidades Locales, así como la falta de continuidad de profesionales tiende a frenar los procesos de gestión, los cuales, al

encontrarse enmarcados en los planes de acción Local, podrían afectar directamente el cumplimiento en el porcentaje final. Es importante resaltar que las dificultades presentadas, implican la búsqueda de alternativas de solución propias de la gestión, gracias a lo cual los resultados conseguidos, han mantenido consistencia con los proyectos trazados al inicio del periodo.

#### 1.4.3.5 **SOLUCIONES**

Para dar continuidad al cumplimiento de las metas fijadas en cada período, es importante resaltar la importancia de la disposición de directivos o sus delegados para la participación en Consejos Locales de Gestión Riesgos, máxime por la situación que atraviesa el Distrito Capital en materia de prevención, lo cual representa un significativo nivel de adaptación a nuevos mecanismos informáticos de seguimiento y articulación entre entidades y ciudadanía de cara al Covid-19.

#### 1.4.3.6 **BENEFICIOS PARA LA CIUDADANÍA**

El empoderamiento en los temas relacionados con el conocimiento, la reducción y manejo del riesgo en las 20 Localidades redundan en el fortalecimiento de estrategias de prevención. La información suministrada y los conocimientos adquiridos por los ciudadanos son difundidos a la comunidad.

#### 1.4.3.7 **REGISTRO FOTOGRAFICOS**




**Operativo de entrega de ayudas Localidad de Suba  
Barrio Lombardía.  
Fecha: 2 de abril  
Cámara de Carolina Moreno Cruz.**



**Acompañamiento operativo de Restitución de Espacio  
Público, Altos de la Estancia  
Localidad Ciudad Bolívar  
Fecha: 13 de mayo  
Cámara de Germán Almanza**



**Operativo de entrega de ayudas Localidad de Suba  
IED Delia Zapata Olivella  
Fecha: 30 de abril  
Cámara de Carolina Moreno Cruz.**

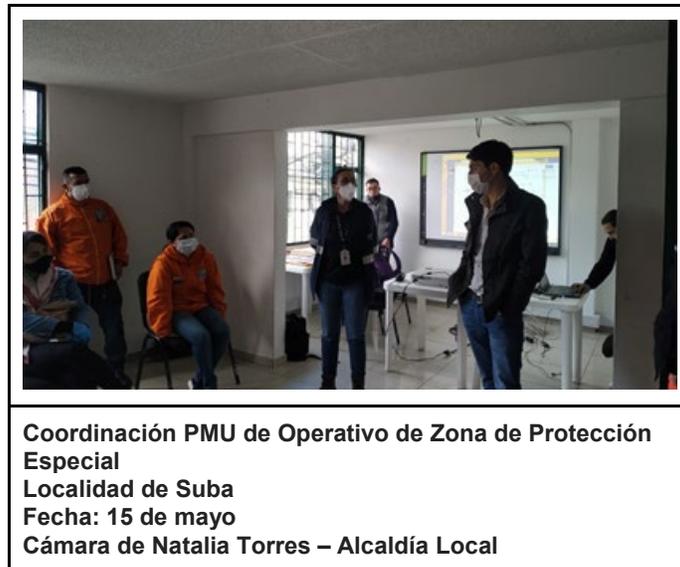

#### 1.4.3.8 SOPORTES DE LOS AVANCES REGISTRADOS:

1. Listados de Asistencia de las actividades de participación comunitaria
2. Actas de Consejos Locales
3. Registros fotográficos
4. Actos Administrativos de adopción de PLGR-CC
6. Planes de Acción aprobados
7. Listados de asistencia en acompañamientos a operativos

**1.5 PAGAR 100 % COMPROMISOS DE LAS VIGENCIAS ANTERIORES  
FENECIDAS PARA IDENTIFICAR LOS PASIVOS EXIGIBLES GENERADOS DEL  
PROYECTO DE INVERSIÓN 1158 (jurídica)**

- 1.5.1 **LOGROS Y/O AVANCES:**
- 1.5.2 **RETRASOS:**
- 1.5.3 **SOLUCIONES:**
- 1.5.4 **SOPORTES DE LOS AVANCES REGISTRADOS:**

**2. CAPÍTULO 2: IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE RECURSOS FONDIGER**

**2.1 ADECUACIÓN DE PREDIOS**

2.1.1 **ARTICULACIÓN CON EL PDGR – CC: COMPONENTE 3. REDUCCIÓN DEL RIESGO Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO “Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático para Bogotá D.C., 2018-2030”.**

**2.1.2 NOMBRE DEL PROGRAMA-PDGR**

Reasentamiento de familias en riesgo y gestión predial.

**2.1.3 NOMBRE DE LA SUBCUENTA**

Reducción del Riesgo

#### **2.1.4 NOMBRE DE LA LÍNEA DE INVERSIÓN**

Evitar nuevos escenarios de riesgo de desastres y mitigar los existentes - Demolición y adecuación de predios.

#### **2.1.5 LOGROS DE LA INVERSIÓN**

Durante el primer semestre de la vigencia, a corte 31 de mayo, se realizó la adecuación de 110 predios, 67 en la localidad de Ciudad Bolívar, 40 en la localidad de San Cristóbal, y 03 en la localidad de Rafael Uribe Uribe.

#### **2.1.6 IMPACTO GENERADO EN LA EJECUCIÓN DE RECURSOS DEL FONDIGER**

Con la adecuación de predios se da respuesta oportuna a la comunidad, se logra minimizar el riesgo social y de seguridad que se viene presentando, y se disminuyen las nuevas ocupaciones dentro de los predios.

### **2.2 REDUCCIÓN VULNERABILIDAD SÍSMICA EN VIVIENDA**

#### **2.2.1 ARTICULACIÓN CON EL PDGR – CC**

Se articula con el PDGRDCC 2018-2039 específicamente en el Componente No.3, Objetivo No.5 Reducir el riesgo Sísmico y de gran impacto.

#### **2.2.2 NOMBRE DEL PROGRAMA-PDGR**

El nombre del programa es 3.3.1. Reducción del riesgo sísmico en vivienda, edificaciones indispensables y de atención a la comunidad.

#### **2.2.3 NOMBRE DE LA SUBCUENTA**

Reducción del Riesgo

#### 2.2.4 NOMBRE DE LA LÍNEA DE INVERSIÓN

Reducción del riesgo sísmico en vivienda, edificaciones indispensables y de atención a la comunidad.

#### 2.2.5 LOGROS DE LA INVERSIÓN

Con el contrato 314-2019, se logró sensibilizar a 122 hogares con la realización de 122 evaluaciones socioeconómicas y de evaluación técnica de la vulnerabilidad Estructural de Vivienda frente a Sismo, se realizaron 15 eventos: 5 eventos en la localidad de Ciudad Bolívar, 5 eventos en la localidad de Usme y 5 eventos en la localidad de Rafael Uribe Uribe; donde se sensibilizó a estas comunidades priorizadas a través de comparsas y el teatro-foro titulado “los hermanos casas y terremoto”; sobre las condiciones de riesgo al que se está expuesto al no contar con los requisitos mínimos de calidad y de diseño de acuerdo a la NSR-10.

Se realizaron 15 diseños completos estructurales para la reducción de la vulnerabilidad sísmica y se hizo en el mes de diciembre de 2019, el ejercicio de rendición de cuentas a la comunidad con el acompañamiento de los presidentes de las juntas de acción comunal, específicamente a los propietarios de las 15 viviendas priorizadas, informando los logros y retos del proyecto piloto.

En el primer trimestre del 2020, se realizaron actividades a los profesionales de planta y contratistas definidos por el IDIGER para garantizar la transferencia del conocimiento adquirido durante el proyecto piloto, por lo que se le solicitó al contratista (Build Change) realizar actividades para poder replicar los ejercicios logrados en el proyecto piloto a través de la adquisición de las capacidades y de contar con los instrumentos (formatos, software, etc.) que le permita al IDIGER replicar la totalidad del ejercicio hasta llegar a los diseños de reducción.

### **Tabla No. 06 Inversión Capacitación Comunitaria para la Reducción de la Vulnerabilidad Sísmica de viviendas**

Actividades	Producto #	Costo Total (incluye IVA) (COP)	%	Estado
<b>ACTIVIDAD 1</b> Preparación y Sensibilización	Producto 1.	\$ 61.285.000,00	24%	Pagado
	Producto 2.	\$ 114.002.000,00	45%	Pagado
<b>ACTIVIDAD 2</b> Laboratorio de soluciones de reducción de vulnerabilidad	Producto 3.	\$ 52.598.000,00	21%	Pagado
<b>ACTIVIDAD 3</b> Sistematización y Cierre	Producto Final.	\$ 27.846.000,00	11%	Pagado
<b>Costo Total</b>		<b>\$ 255.731.000,00</b>	<b>100%</b>	

Con respecto al convenio interadministrativo 329-2019 con el IDIPRON, se replicó el ejercicio con los jóvenes del IDIPRON, en donde fue necesario realizar la transferencia de conocimientos inicialmente durante el último trimestre del 2019 y la realización de la estrategia de sensibilización se efectuó en el primer trimestre de 2020. Logrando que los jóvenes transmitieron los conocimientos adquiridos a las comunidades priorizadas con la implementación de la estrategia de sensibilización, obteniendo: 12 eventos en los barrios priorizados en donde adicionalmente se tuvo el apoyo de los presidentes de las juntas de acción comunal - JAC: 5 eventos en la localidad de Ciudad Bolívar, 6 eventos en la localidad de Usme y 1 evento en la localidad de Rafael Uribe Uribe y 7 evaluaciones socioeconómicas y de evaluación técnica de la vulnerabilidad Estructural de Vivienda frente a Sismo, para un total de 44 evaluaciones en Ciudad Bolívar, 41 evaluaciones en Use y 44 evaluaciones en Rafael Uribe Uribe.

A la fecha se encuentra en proceso de liquidación el convenio en mención y a la espera que el IDIPRON, entregue la información financiera con sus respectivos soportes correspondientes a las actividades realizadas en el último trimestre del 2019 y el primer trimestre del 2020. Informe financiero que está articulado con el informe técnico, administrativo y jurídico.

## 2.2.6 IMPACTO GENERADO EN LA EJECUCIÓN DE RECURSOS DEL FONDIGER

Como acción para cumplir las tres líneas estratégicas del Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático para Bogotá D.C., 2018-2030, en el

Componente 3. Objetivo 5. “Reducir el riesgo sísmico y de gran impacto”, incluyendo líneas de acción tales como:

- Promoción del reforzamiento estructural de vivienda no sismo resistente.
- Implementación de pilotos de reforzamiento estructural y promoción de técnicas de reforzamiento estructural en edificaciones de vivienda no sismo resistente.
- Diseño e implementación de instrumentos para el reforzamiento estructural de vivienda no sismo resistente.

Se desarrolló durante el segundo semestre de 2019 y el primer trimestre del año 2020, el proyecto piloto “Capacitación comunitaria de Reducción de la vulnerabilidad sísmica en viviendas”, teniendo impacto en las localidades de Ciudad Bolívar, Usme y Rafael Uribe Uribe, cuyo fin fue el de sensibilizar a las comunidades sobre la condición de riesgo sísmico al que están expuestas, la protección de su propia vida, la de sus familiares y de su patrimonio y a la vez el IDIGER con la experiencia vivida lograr darle continuidad a la reducción del riesgo sísmico en viviendas, creando rutas estratégicas para lograr la meta del PDGRDCC 2018-2020 de reforzar 10 viviendas con el fin de promover técnicas de reforzamiento para el año 2020.

### 2.3 LIMPIEZA DE RIOS, QUEBRADAS Y CANALES (CUERPOS DE AGUA)

Las actividades de limpieza de canales y quebradas se realizan por medio del convenio interadministrativo el cual tiene como objeto de *“Aunar esfuerzos técnicos, operativos, administrativos y financieros entre la Empresa De Acueducto, Alcantarillado Y Aseo De Bogotá (EAB), el Instituto Distrital De Gestión Del Riesgo Y Cambio Climático – IDIGER y Aguas De Bogotá S.A. E.S.P.”*

La articulación de esfuerzos técnicos, operativos, administrativos y financieros realizados por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB- ESP, el IDIGER y Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. en el marco del convenio, permitieron el desarrollo del plan de acción establecido para la intervención de quebradas, canales y estructuras de la ciudad de Bogotá, por medio del cual se adelantan actividades de retiro manual o mecánico de Residuos Sólidos en los taludes de canales, quebradas y/o estructuras en el Distrito, cargue

y transporte hasta el sitio de aprovechamiento y/o disposición final debidamente autorizado por la Autoridad Ambiental competente.

### 2.3.1 ARTICULACIÓN CON EL PDGR – CC

Componente 3. Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático.

### 2.3.2 NOMBRE DEL PROGRAMA-PDGR

Gestión integral del agua para la adaptación.

### 2.3.3 LOGROS DE LA INVERSIÓN

Las actividades desarrolladas permitieron la reducción de riesgos asociados a escenarios de inundaciones y encharcamientos garantizando el flujo libre del agua, ya que en época de lluvias se forman obstrucciones por arrastre de materiales. Igualmente, se realizó el retiro de residuos sólidos en las estructuras como disipadores, rejillas, desarenadores y/o sumideros que se ven obstruidos en su mayoría por el material particulado que suelen arrastrar las aguas de escorrentía. Una de las principales causas identificadas como generadoras de eventos asociados a inundación y desbordamiento de cauce es la presencia de residuos sólidos que llegan a obstruir los cuerpos de agua sobre todo durante las dos épocas de lluvia que ocurren en la ciudad.

A Continuación se presentan los resultados operativos de las actividades de limpiezas y de canales y quebradas.

## **Tabla No. 07 Resultados operativos de actividades de limpieza (canales y quebradas)**

Periodo	Cuenca	Cuerpos de agua programados	Cuerpos de agua intervenidos	Ejecutados totales	Metros lineales intervenidos	m3 de residuos recogidos y dispuestos
Enero	Torca	10	15	15	5.561	2.070
	Salitre	15	15	15	13.888	1.290
	Fucha	10	10	15	7.084	2.986
	Tunjuelo	11	11	15	11.292	2.065
	Tintal	11	11	15	6.129	4.410
Febrero	Torca	7	7	7	1.546	1.755
	Salitre	12	12	12	9.205	1.200
	Fucha	7	7	7	9.784	2.850
	Tunjuelo	19	19	19	7.639	1.917
	Tintal	6	6	6	3.572	3.375
Marzo	Torca	7	7	7	5.244,42	1.530
	Salitre	11	11	11	10.541,37	1.185
	Fucha	8	7	7	4.667,59	3.000
	Tunjuelo	12	12	12	9.786	3.921
	Tintal	7	7	7	2.995,04	2.895
Abril	Torca	1	1	1	400	1.950
	Salitre	5	5	5	3.915	870
	Fucha	2	2	2	2.114,96	1.716
	Tunjuelo	6	6	6	3.070	2.392
	Tintal	2	2	2	247	2.130
				<b>TOTAL</b>	<b>118.681</b>	<b>45.507</b>

#### 2.3.4 IMPACTO GENERADO EN LA EJECUCIÓN DE RECURSOS DEL FONDIGER

Los recursos asignados a la EAAB para la limpieza de canales y quebradas por la junta directiva de FONDIGER, ha permitido la participación y articulación operacional para prevenir, mitigar y atender eventos de emergencias registrados en el SIRE relacionados con escenarios de inundaciones o encharcamientos.



**LINDÓN LOSADA PALACIOS**

Subdirector Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático  
Gerente Proyecto

Elaborado por:

Claudia Elizabeth Rodríguez / Profesional especializado 222-29 

Ligia Cañón / Profesional especializado 222-23 

Liliana E. Esquivel Casallas / Profesional universitario 219-12 

Lina Guerrero/ Profesional universitario 219-12 

Martha Lucia Vivero / Profesional universitario 219-12 

Nancy Tovar / Profesional especializado 222-23 

Wilson Pulido / Profesional especializado 222-29 

David Fernando Suarez Morales / Contratista SRR ACC 

Revisó: Lindón Losada Palacios – Subdirector para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático.
